


現場位置図

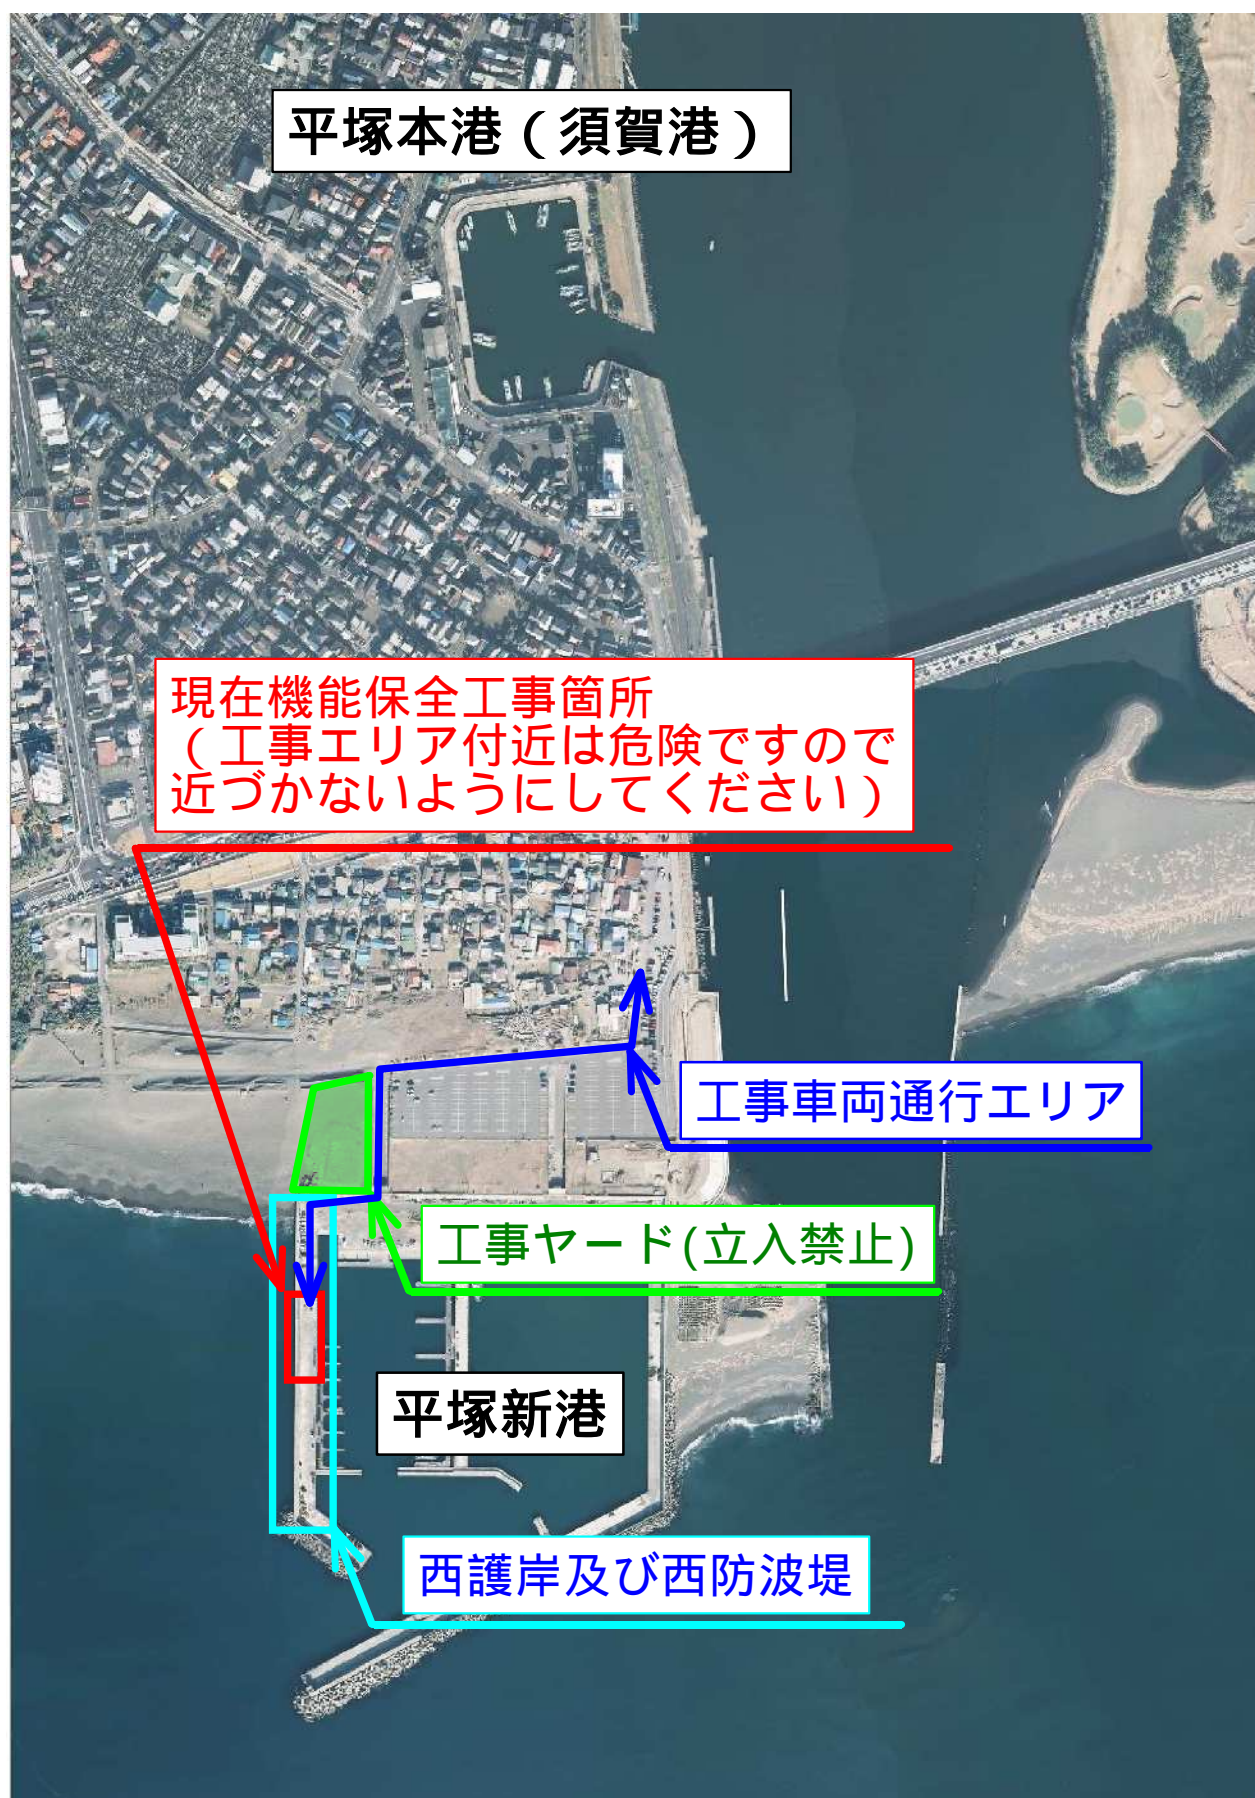

平塚漁港西防波堤（１）機能保全工事その１

工事スケジュール

工期：R6.2.2～R7.3.21（令和5年度工事）

床板下部補強

期 間

R 6 . 8 ～ 9

既存の施設に大型重機が作業できるようにするための工事です。

仮設耐波浪材設置

期 間

R6.10～12

コンクリート被覆を行う作業場所に波が入らないようにします。

コンクリート被覆

期 間

R 7 . 1 ～ 2


既存の施設を支えている基礎の補修を行います。

仮設耐波浪材撤去

期 間

R 7 . 2 ～ 3

耐波浪材の撤去を行います。

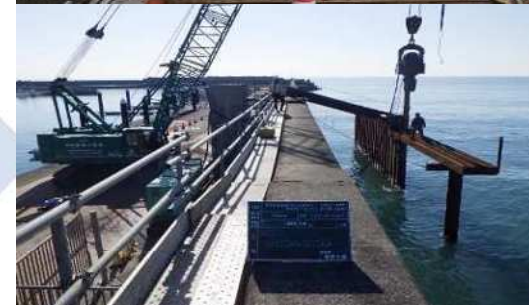

平塚漁港機能保全事業 西護岸・西防波堤工事予定平面図

