


現場位置図

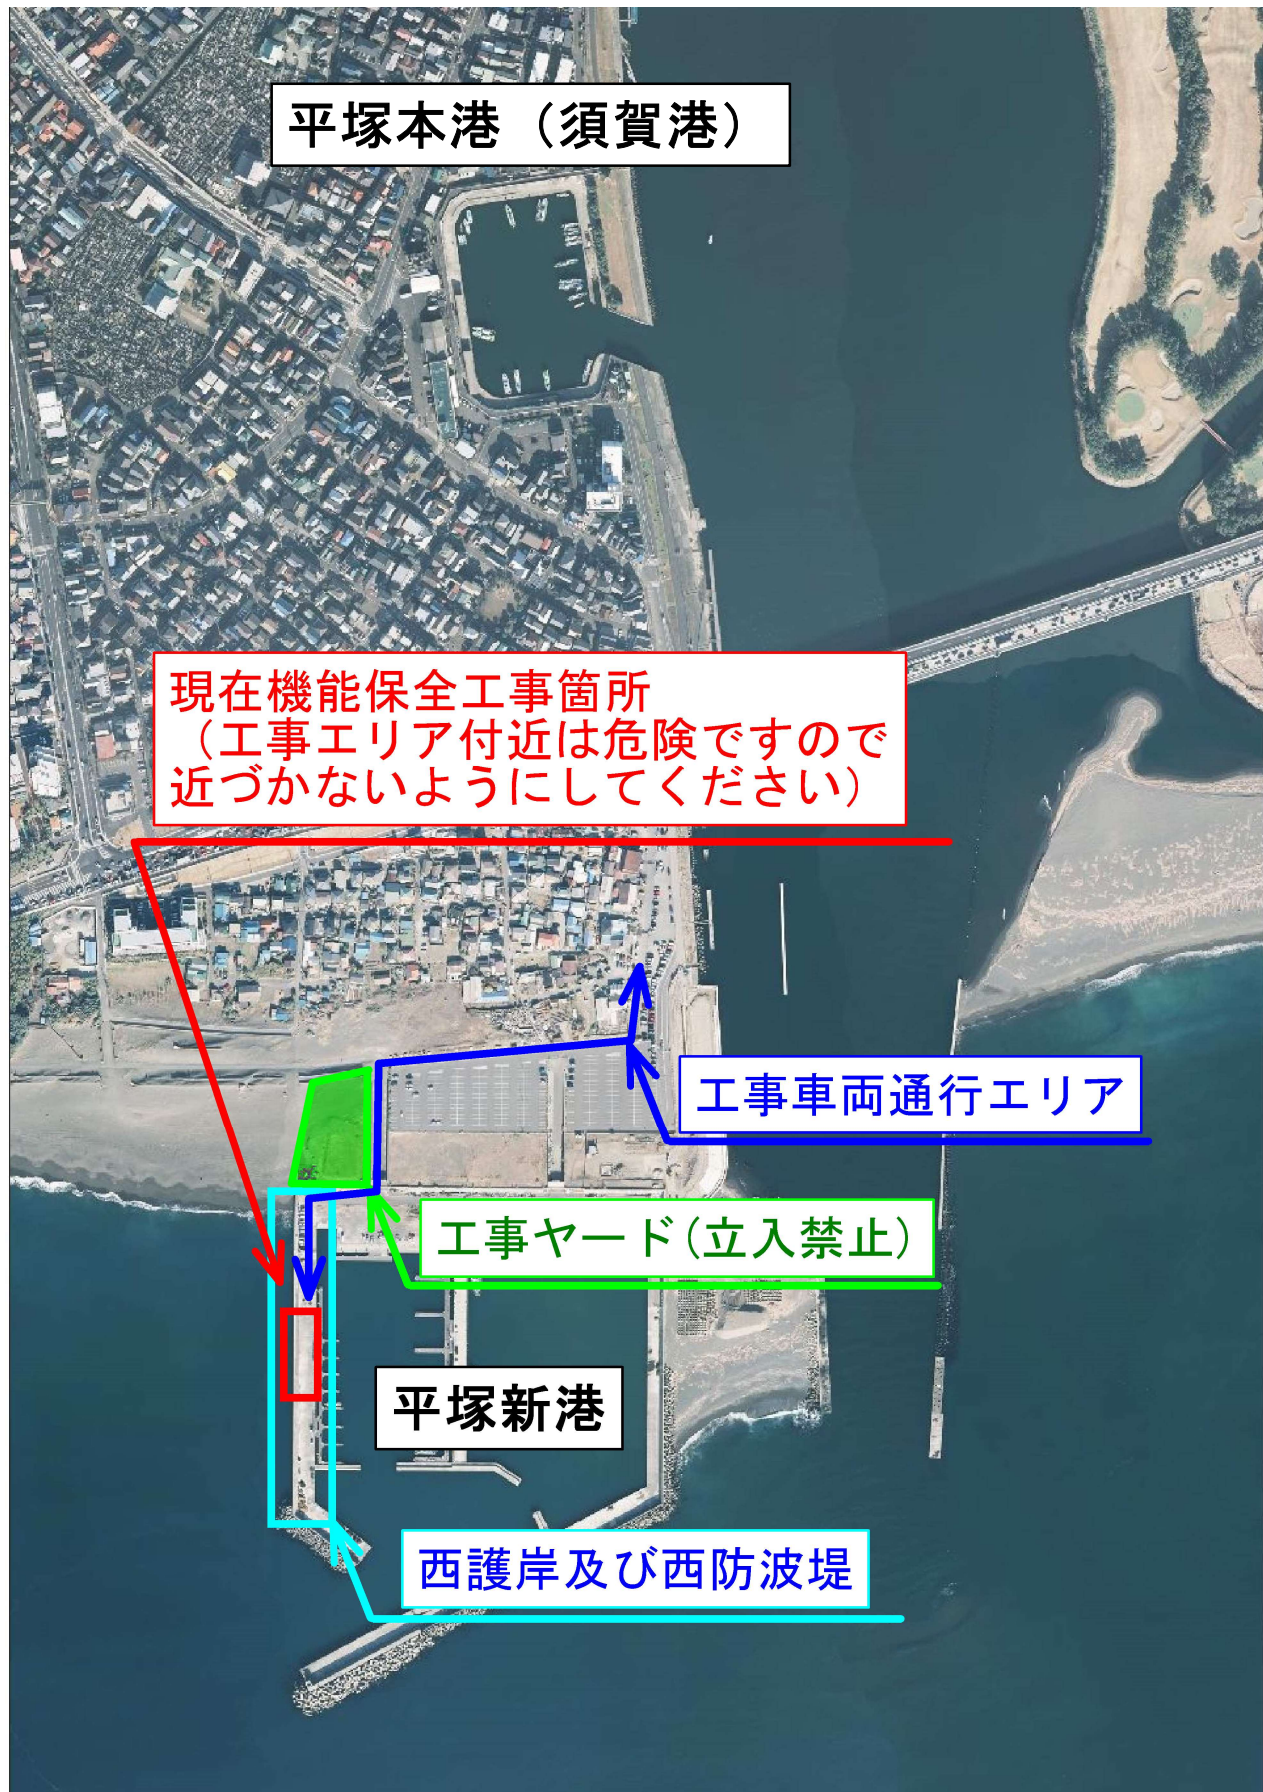

平塚漁港西防波堤（１）機能保全工事その２

工事スケジュール

床板下部補強

期 間

R 7 . 7 ~ 9

既存の施設に大型重機が作業できるようにするための工事です。



仮設耐波浪材設置

期 間

R7.10~12

コンクリート被覆を行う作業場所に波が入らないようにします。



コンクリート被覆

期 間

R 8 . 1 ~ 2

既存の施設を支えている基礎の補修を行います。



仮設耐波浪材撤去

期 間

R 8 . 2 ~ 3

耐波浪材の撤去を行います。



平塚漁港機能保全事業 西護岸・西防波堤工事予定平面図

