

平成27年度事業予定及び進捗状況

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	毎月1回(6回)実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			・平塚駅サービス勉強会 12回 ・平塚駅北口バリアフリールート3者協議(平塚市・JR東日本・湘南シーヨビル)6回	・毎月1回(6回)実施済 ・2回実施済
	サービス介助士の資格取得の推進	年3人	【継続】			平塚駅社員資格取得 3人以上	平成28年1月 試験実施予定(26年度は7人取得済み)
バス事業	ノンステップバスの導入	81両	【長期】			12両(累計23両)	8両(年度末までに4両導入予定)
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			1箇所	0箇所(実施場所・実施方法などを検討中)
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回	6回(4~9月の乗務員教育において全従業員に実施)
タクシー事業	UDタクシーの導入	年1台	【長期】			-	-
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			随時	6回(概ね月1回の平塚タクシー地区会合を通じて随時情報共有)
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			1回以上	毎月1回(6回)の乗務員教育でバリアフリー事業の教育

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況幅員でのEVの設置検討 ・現況幅員での斜路付き階段への架け替え検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			30m + 60m = 90m (累計180m)	90m施工中(別紙参照)
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			40m + 40m = 80m (累計290m)	64m + 0m = 64m完了(別紙参照)) 湘南海岸公園入口40m区間を除いた。
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	11箇所	【長期】			-	-
	側溝の床板化	10m	【長期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【長期】			-	-
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【中期】			-	-
	側溝の床板化	165m	【中期】			-	-
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】			44箇所(累計44箇所)	1月中旬頃より工事着手予定 (別紙参照)
	歩道切り下げ改修(8%超え)	32箇所	【短期】			32箇所(累計32箇所)	詳細調査の結果、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後事業計画の変更も視野に検討していきたい。

8 南町通東浅間線（幹道34号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】			550m（累計550m）	1月中旬頃より工事着手予定（別紙参照）
9 海岸南中線（幹道43号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	4箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【短期】			-	-
	歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【短期】			-	-
10 宝町通り線（幹道30号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】				
11 南町通り線（幹道32号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】			-	-
12 東海道本通り線（幹道29号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	26箇所	【中期】			-	-
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	1箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】			-	-

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	380m	【長期】			-	-
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】			-	-
15 浅間町3号線	歩道切り下げ改修（8%超え）	7箇所	【中期】			-	-
	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	2箇所	【中期】			-	-
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	10箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			-	-
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	12箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			-	-

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【中期】			-	-
19 三島神社後谷線(幹道36号)	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【中期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			-	-
20 追分7号線	巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	4箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修(8%超え)	8箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【中期】			-	-
	歩道舗装打ち換え(植樹樹隆起のため)	600m	【長期】			-	-

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【短期】			-	未舗装駐車場の舗装を行う改修事業は白紙となったため、今後事業計画の変更も視野に検討していきたい。
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【短期】			-	〃
	園路の改善(勾配)	20m	【中期】			-	-
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			-	-
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700m ²	【中期】			再整備実施設計委託	湘南海岸公園において「道の駅」の整備計画を進めてきたが、海岸エリア全体の魅力アップの全体構想を先に策定し、湘南海岸公園の位置付けを決定することになった。(平成27年7月22日) よって、本年度予定の設計委託は行わず、全体構想の策定後、事業を進めていく。

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、必要かつ設置可能箇所については、その都度検討する。	・付加装置付信号機点検は、20箇所実施しており年度内に29箇所全て終了予定。 ・重点地域の横断歩道、標識等の補修を上申中。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回強化期間に合わせ、違法駐車パトロール隊によるパトロールを実施	6月の強化期間を実施し、2回目は10月を予定。パトロール隊と合同で実施。
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・キャンペーンの実施、悪質な自転車利用者等に対しては指導・取締りを強化する。 ・交通安全教室等を開催し、歩行者の安全を確保する。 ・主要交差点等に警察官を配置し、交通監視を実施する。悪質危険な歩行者妨害違反の指導取締りを推進していく。	・キャンペーンについては、各季の交通安全運動期間中や道路交通法改正時に実施。 ・交通安全教室、チリリンスクール、交通安全講話等を学校、企業、地域団体、公務所等で随時開催実施。 ・毎月1日、15日の交通安全日、各季の交通安全運動中に交差点における交通監視、街角アドバイス等を通じて啓発活動を実施。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	2回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(関係課と検討中)
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(関係課と検討中)
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(関係課と検討中)
平塚駅駐輪場対策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			-	平塚駅南口駅前広場周辺に停めている自転車に対して、平成27年4月1日に供用開始した八重咲町第2駐輪場へ誘導している。
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	2回(10月中に市内の全高等学校8校で実施予定)
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年での実施	通年で実施中。昨年度と比較して、放置自転車は減少の傾向。
安全行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】				
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			(1km(累計2km 平塚駅花水線))	(交通管理者と協議中。(生活関連経路外))
リー心のバリアフリー(理解の手)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回以上	【継続】			2回	0回(12月9日前後で開催予定)
	疑似・点字・誘導体験の実施	年45回	【継続】			45回	38回 車イス体験：12回、高齢者疑似体験：10回 点字体験：8回、誘導体験：8回 主に市内小中学校で実施(児童生徒、教員向け)

その他の事業


項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成27年度 事業予定	平成27年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー ない(理解、 情報提供、 手助け、 利用を妨げ)	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回	0回 「障害者週間」キャンペーンでの発行に向け検討中
	生活関連施設等の各ホームページにおけるバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			10施設	発信内容について、検討中
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			骨格の検討、各施設等への周知	他自治体等の事例研究
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成27年5月25日(月)開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 平成27年5月25日(月)開催の商店会長会議において配布 別紙資料参照
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 平成27年5月25日(月)開催予定の商店会長会議において依頼予定	1回 平成27年5月25日(月)開催の商店会長会議において事例紹介及び取組依頼 別紙資料参照
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	10回 町内福祉村における、ボランティアを対象とした自主的な研修会を計上。主なテーマは、介護保険法改正、介護予防、ボランティア活動の心構えなど
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【短期】			- (設置位置及び表示内容の調整,サイン設置による効果測定)	平成28年度の整備に向けて、設置位置や表示内容について課内で検討。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【短期】			-	平成28年度の修繕に向けて、各サインの現状把握や追加する案内板の位置等について課内で検討。

道路特定事業

路線名	県道606号(大島明石)	事業者	神奈川県
事業区間	八幡宮前～平塚市総合公園	区間延長	1460m
事業内容	歩道の段差を改善します。(大原交差点～平塚市総合公園)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道の段差改善	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		90m							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

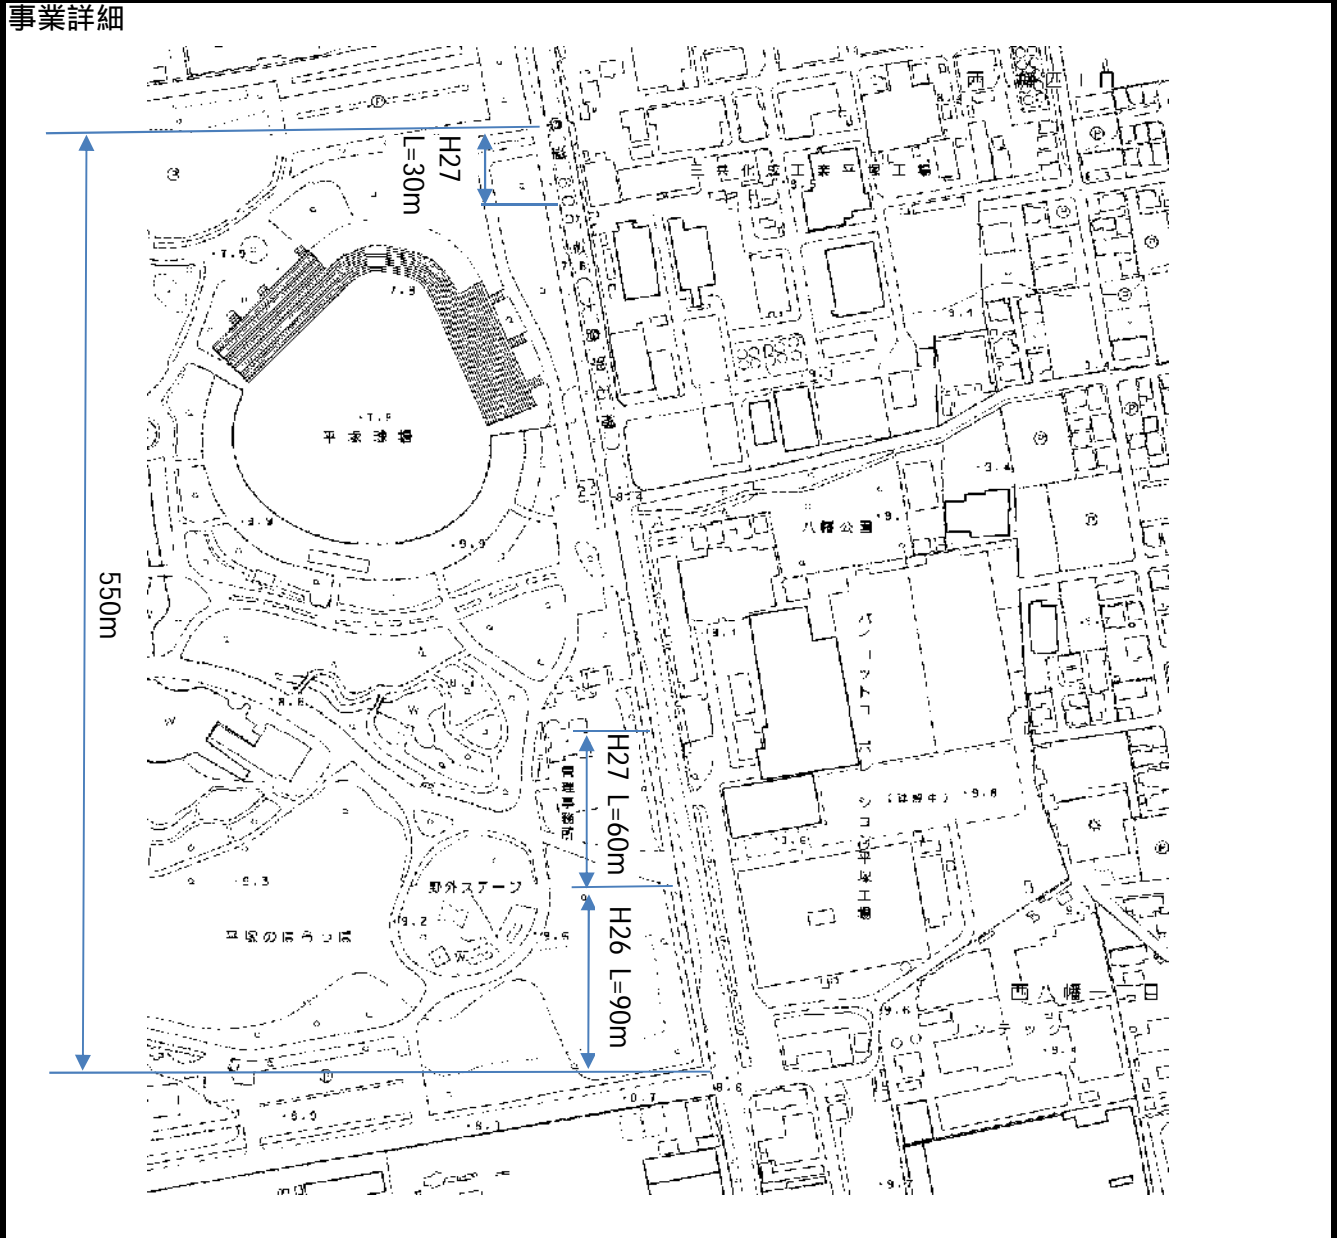

道路特定事業

路線名	県道608号(平塚停車場袖ヶ浜)	事業者	神奈川県
事業区間	平塚駅南口~平塚駅南口入口交差点	区間延長	1220m
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 (ふれあい平塚ホテル~平塚駅南口入口交差点)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

--

事業詳細



道路特定事業

路線名	南町通東浅間線（幹道34号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	713m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	44箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修（8%超え）	32箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項


歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

平成27年度整備予定箇所
巻き込み部改修
... 44箇所

歩道切り下げ改修
... 32箇所

視覚障害者誘導用ブロック改修
... 550m

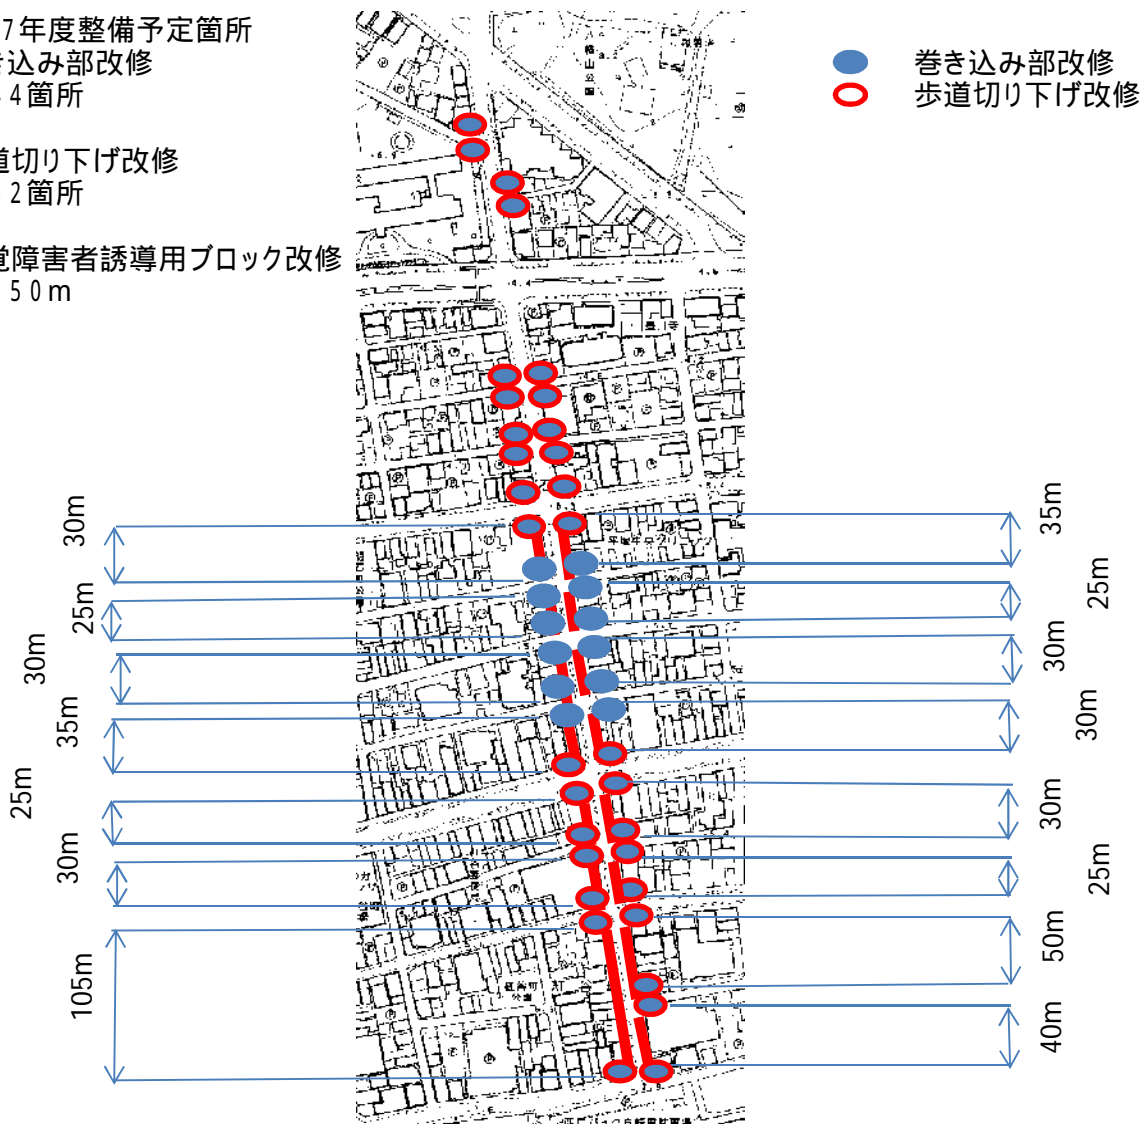


あぶない、！

あなたは、路上にモノを**放置**していませんか？

県内において、自転車で歩道を走っていた少年が、路上に**放置された商品**を避けようとして接触、車道に**転倒し死亡**するといういたましい事故が発生し、商品を放置した者が道路交通法違反により書類送検されました。

このように歩道上に物件を放置することは、道路の機能を阻害し、歩行者・車いすを利用されている方等の安全な通行の妨げになり、道路交通法及び道路法に違反しますので、歩道上に物件を放置しないようご協力をお願いいたします。

また、買物などでの自転車についても近くの駐輪場を利用していただくなど、道路利用者の安全確保のためにご協力をお願いいたします。



平塚警察署・平塚市

歩道の段ボールで転倒、事故死

放置の店主書類送検

道交法違反容疑

自転車の小学生がトラックにはねられ死亡したのは、歩道に置かれた段ボール箱に接触して車道に転倒したのが原因として、神奈川県警三崎署は十三日、段ボール箱を置いた同県三浦市内の電器店経営者(男)を道交法違反(道路における禁止行為)の疑いで、横浜地検横須賀支部に書類送検した。県警によると、路上に放置された商品などを巡り、刑事責任が問われるのは異例だという。

事故があったのは今月五日午後。同市三崎町で、自転車で歩道を行っていた同市立名向小学校三年鈴木慎也君(九)が、トラックにはねられて死亡した。調べによると、電器店前の歩道に洗濯機入りの段ボール箱

(約六十五センチで、高さ約九十五センチ)があり、これに慎也君の自転車のハンドルが接触、車道に転倒した。電器店の前ではほかにテレビの空き箱なども置かれ、実際に通れる幅は約八十センチだ。経営者は開店時に商品を表示する目的で段ボール箱を置いていたという。

こころのバリアフリー

～みんなが利用しやすいお店を目指しましょう～



☆こころのバリアフリーとは☆

まちには高齢者や障がいのある方、その他様々な方々があります。

誰もがお店を気持ちよく利用することができるよう相手を理解し、気遣いや思いやりを持って接することなど相手の立場に立ち行動するよう心掛け、お客様をおもてなしすること



～みんなが利用しやすいお店を目指すために～

- ①いつも笑顔で接客することを心がけましょう！
- ②困っているお客様の要望を確認しましょう！
- ③お客様に合わせた対応に努めましょう！
- ④使いやすいお店づくりに努めましょう！
- ⑤みんながまた来たくなるお店を目指しましょう！



(発行年月) 平成 27 年 5 月

(発行) 〒254-8686

神奈川県平塚市豊原町 2-14

平塚市産業振興部 商業観光課

TEL 0463-35-8107

FAX 0463-35-8125

8ページ その他の事業
心のバリアフリー
