

## 平成28年度事業予定及び進捗状況(10月1日時点)

## 公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 毎月1回(6回)実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回	平塚駅サービス勉強会 毎月1回(6回)実施済 (平塚駅北口バリアフリールート3者協議[平塚市、駅ビル事業者、JR東日本]1回実施済)
	サービス介助士の資格取得の推進	年3人	【継続】			平塚駅社員資格取得 3人	平塚駅社員資格取得(1月試験実施予定) (27年度は2人取得済み)
バス事業	ノンステップバスの導入	81両	【長期】			18両(累計41両)	6両(累計47両)
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			-(実施に向け検討中)	0箇所
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上	6回
タクシー事業	UDタクシーの導入	年1台	【長期】			-(導入に向け検討中)	UDタクシーについては導入検討中であるが、今年度、相模中央交通において福祉タクシーを2台導入予定
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回	4回 地区会、街頭指導を各社で実施
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回 月1回の乗務員教育で実施	6回 各社月1回の乗務員教育を実施

## 道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>	・平塚市と検討協議中
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			370m(累計550m)	370m発注準備中
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			216m + 40m = 256m(累計530m)	216m + 40m = 256m(累計530m)完了
6 駅前大通り線(幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	11箇所	【長期】			-	-
	側溝の床板化	10m	【長期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【長期】			-	-
7 駅前通り線(幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【中期】			2箇所(累計10箇所)	2箇所(累計10箇所)
	側溝の床板化	165m	【中期】			-	-
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】			28箇所(累計44箇所)	28箇所(累計44箇所) 12月上旬頃より工事着手予定
	歩道切り下げ改修(8%超え)	32箇所	【短期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。	個々の現場条件に応じた対応可能な整備方法を関係団体と調整してまいります。

8 南町通東浅間線（幹道34号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】			245m（累計550m）	245m（累計550m） 12月上旬頃より工事着手予定
9 海岸南中線（幹道43号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	4箇所	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
10 宝町通り線（幹道30号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	29箇所	【短期】			-	
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】			-	
11 南町通り線（幹道32号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
12 東海道本通り線（幹道29号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	26箇所	【中期】			-	
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	1箇所	【短期】			-	1箇所（累計1箇所） 2月下旬頃より工事着手予定
	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】			-	2箇所（累計2箇所） 2月下旬頃より工事着手予定

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】			-	
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	380m	【長期】			-	
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セーフェイスつきでない）	10箇所	【中期】			-	
	歩道切り下げ改修（8%超え）	10箇所	【中期】			-	
15 浅間町3号線	歩道切り下げ改修（8%超え）	7箇所	【中期】			-	
	巻き込み部改修（セーフェイスつきでない）	2箇所	【中期】			-	
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セーフェイスつきでない）	10箇所	【短期】			7箇所（累計10箇所）	7箇所（累計10箇所） 12月上旬頃より工事着手予定
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			歩道切下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。	個々の現場条件に応じた対応可能な整備方法を関係団体と調整してまいります。
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			340m（累計340m）	340m（累計340m） 12月上旬頃より工事着手予定
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セーフェイスつきでない）	12箇所	【短期】			12箇所（累計12箇所）	国の交付金を活用して整備を行っており、平成28年度補正予算を活用し整備予定
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			315m（累計315m）	国の交付金を活用して整備を行っており、平成28年度補正予算を活用し整備予定

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【中期】			-	
19 三島神社後谷線(幹道36号)	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【中期】			-	
	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			-	
20 追分7号線	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	4箇所	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	歩道切り下げ改修(8%超え)	8箇所	【短期】			-	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成29年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【中期】			-	
	歩道舗装打ち換え(植樹樹隆起のため)	600m	【長期】			-	

### 都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【短期】			駐車場改修の決定後、事業を進めていく	駐車場改修に向け、その方策について検討を進めている。
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【短期】			駐車場改修の決定後、事業を進めていく	駐車場改修に向け、その方策について検討を進めている。
	園路の改善(勾配)	20m	【中期】			なだらかな勾配の取れるルートを検討していく	なだらかな勾配の取れるルートの検討をしている。
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			動きの重いトイレドアについて注油し、動きの悪いものは改修を行う	点検巡回時に注油及び部品交換を実施した。
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【中期】			全体構想での位置付けが決定後、事業を進めていく	「ひらつか海岸エリア魅力アップチャレンジ」(平成28年5月25日策定)による湘南海岸公園の施設整備の方向性に準じ、事業を進めていくことになった。

### 交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。	生活関連経路の一時停止・横断歩道を中心とした点検を随時実施。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回(6月、10月) 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	交通安全講話等を通じ違法駐車追放の協力依頼を働きかけた。
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> <li>各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。</li> <li>交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。</li> <li>各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、多発傾向にある自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。</li> <li>警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>各季交通安全運動期間中にキャンペーンを実施</li> <li>交通安全教室、交通安全講話44件実施</li> <li>各季交通安全運動等における交通監視活動及び赤色灯を点灯させた警戒活動を実施した。</li> <li>警察署ホームページを通じ、様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施した。</li> </ul>

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	1回(今後も年度内に協議実施予定)
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(上記施設管理者との協議と同時実施予定)
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(上記施設管理者との協議と同時実施予定)
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回(上記施設管理者との協議と同時実施予定)
平塚駅駐輪場対策周辺の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			-	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	0回(10月中8回実施予定)
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年での実施	実施中
安歩全行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			-	-
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			0.5km(南町通東浅間線)(累計1.5km)	12月上旬頃より工事着手予定
心(フリー)のバリアフリー(手助け)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回以上	【継続】			2回	2回(春・夏開催の福祉事業所製品展示即売会にて心のバリアフリーチラシの配布)
	疑似・点字・誘導体験の実施	年45回	【継続】			45回	20回(今後も予定どおり実施予定)

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定	平成28年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー(理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回	0回(12月の障害者週間を目途に作成・配布予定)
	生活関連施設等の各ホームページにおけるバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			10施設(累計17施設)	0施設(各ホームページ管理者と継続協議)
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			バリアフリーマップ素案の検討	今後素案の検討に向け、関係団体と協議予定
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成28年5月に開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 平成28年5月20日開催の商店街連合会において啓発パンフを配布
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議(5/20開催予定)で資料を配布し、活動事例等を紹介しながら、各個店や商店街での取組みを働きかけます。	1回 商店会長会議(5/20開催)で資料を配布し、活動事例等を紹介しながら、各個店や商店街での取組みを働きかけました。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	1回(今後も予定どおり実施予定)
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【短期】			設置10箇所、修繕15箇所 庁内関係課の意見も踏まえ、本体の修繕や表示内容等の更新を実施予定。	・駅周辺公共施設案内サインの設置及び修繕に向けて、庁内関係課等との意見交換を実施し、その意見を踏まえて、「平塚市公共施設景観ガイドライン(歩行者系公共サイン)」の一部改訂を行った。 現在、改訂したガイドラインを踏まえ、サインの設置や修繕等工事に向け、準備を進めている。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【短期】				



道路特定事業


路線名	県道606号(大島明石)	事業者	神奈川県
事業区間	八幡宮前～平塚市総合公園	区間延長	1460m
事業内容	歩道の段差を改善します。(大原交差点～平塚市総合公園)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道の段差改善	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		90m	90m						
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

--

事業詳細

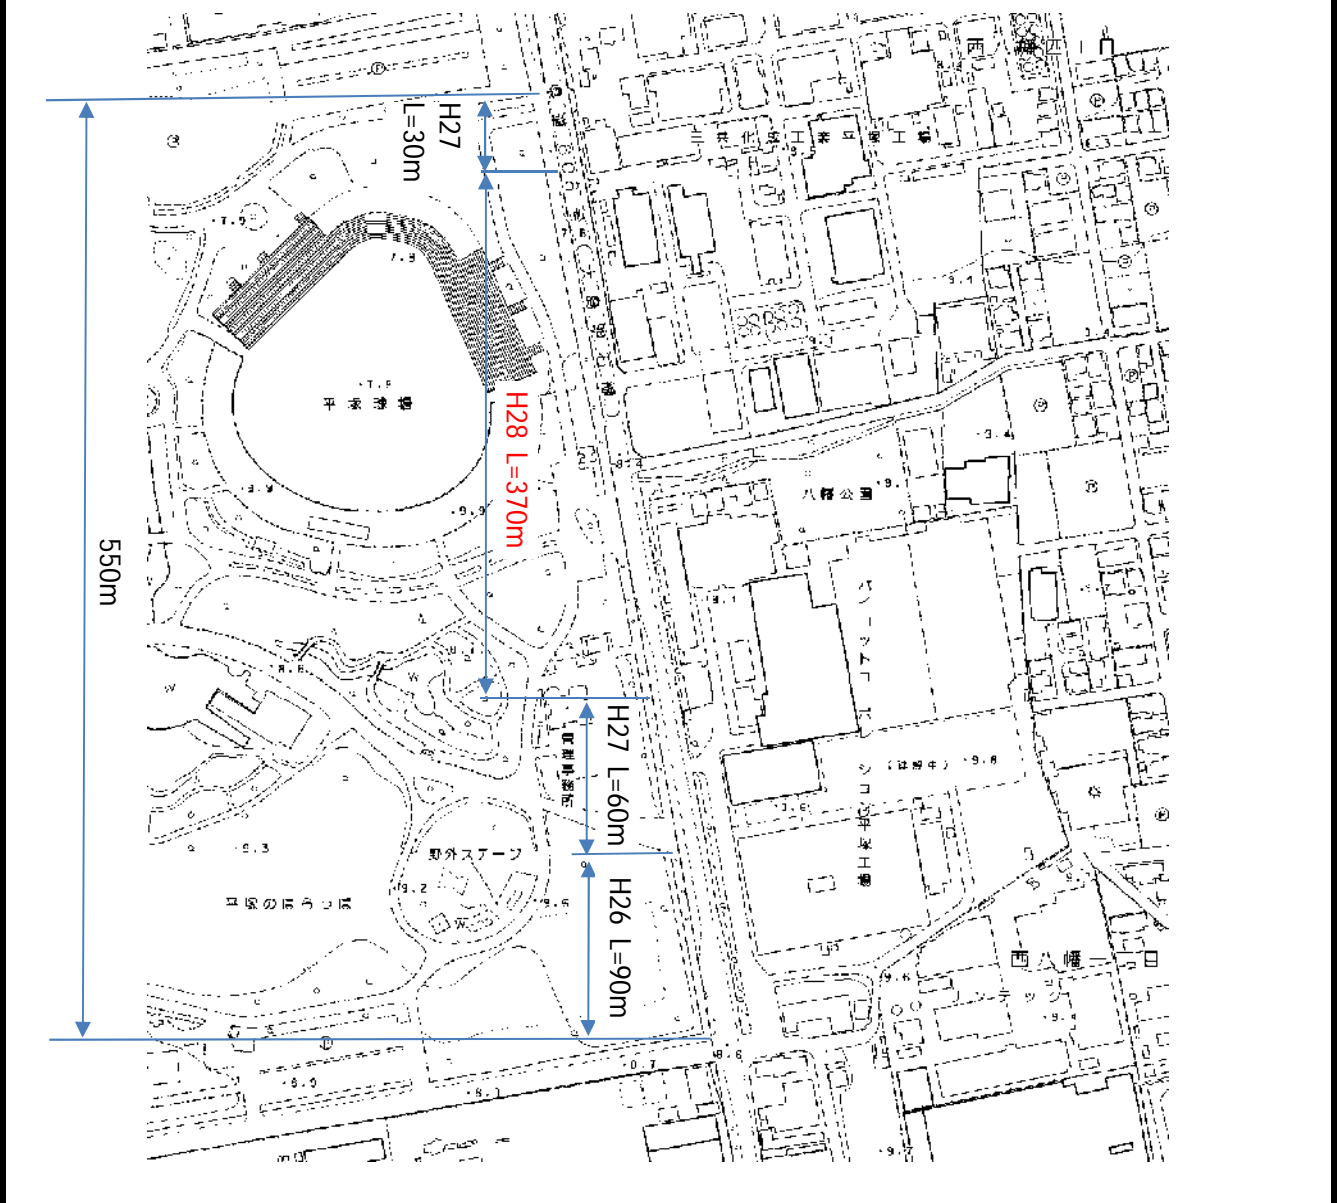

道路特定事業

路線名	県道608号(平塚停車場袖ヶ浜)	事業者	神奈川県
事業区間	平塚駅南口~平塚駅南口入口交差点	区間延長	1220m
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 (ふれあい平塚ホスピタル~平塚駅南口入口交差点)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		210m	64m	256m					
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

--

事業詳細



道路特定事業

路線名	駅前通り線（幹道47号）	事業者	平塚市
事業区間	宮の前交差点 ～ 県合同庁舎前交差点	区間延長	603m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	15箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
側溝の床板化	165m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて進めていく予定です。

事業詳細

平成28年度整備箇所  
巻き込み部改修  
... 2箇所

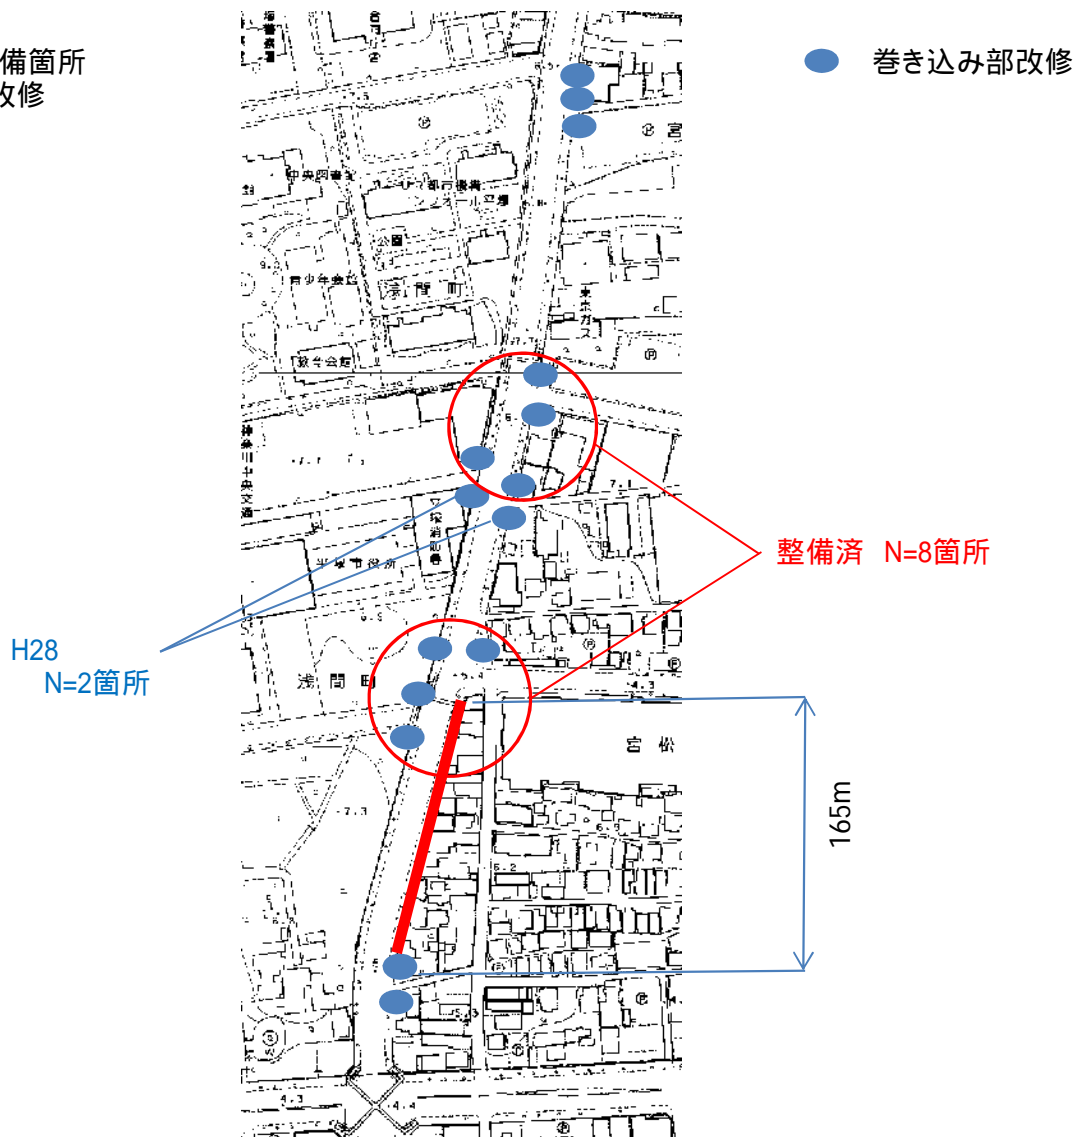

路線名	南町通東浅間線（幹道34号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	713m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	44箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修（8%超え）	32箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
			305						

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

平成28年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修  
 ... 28箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック改修  
 ... 245m

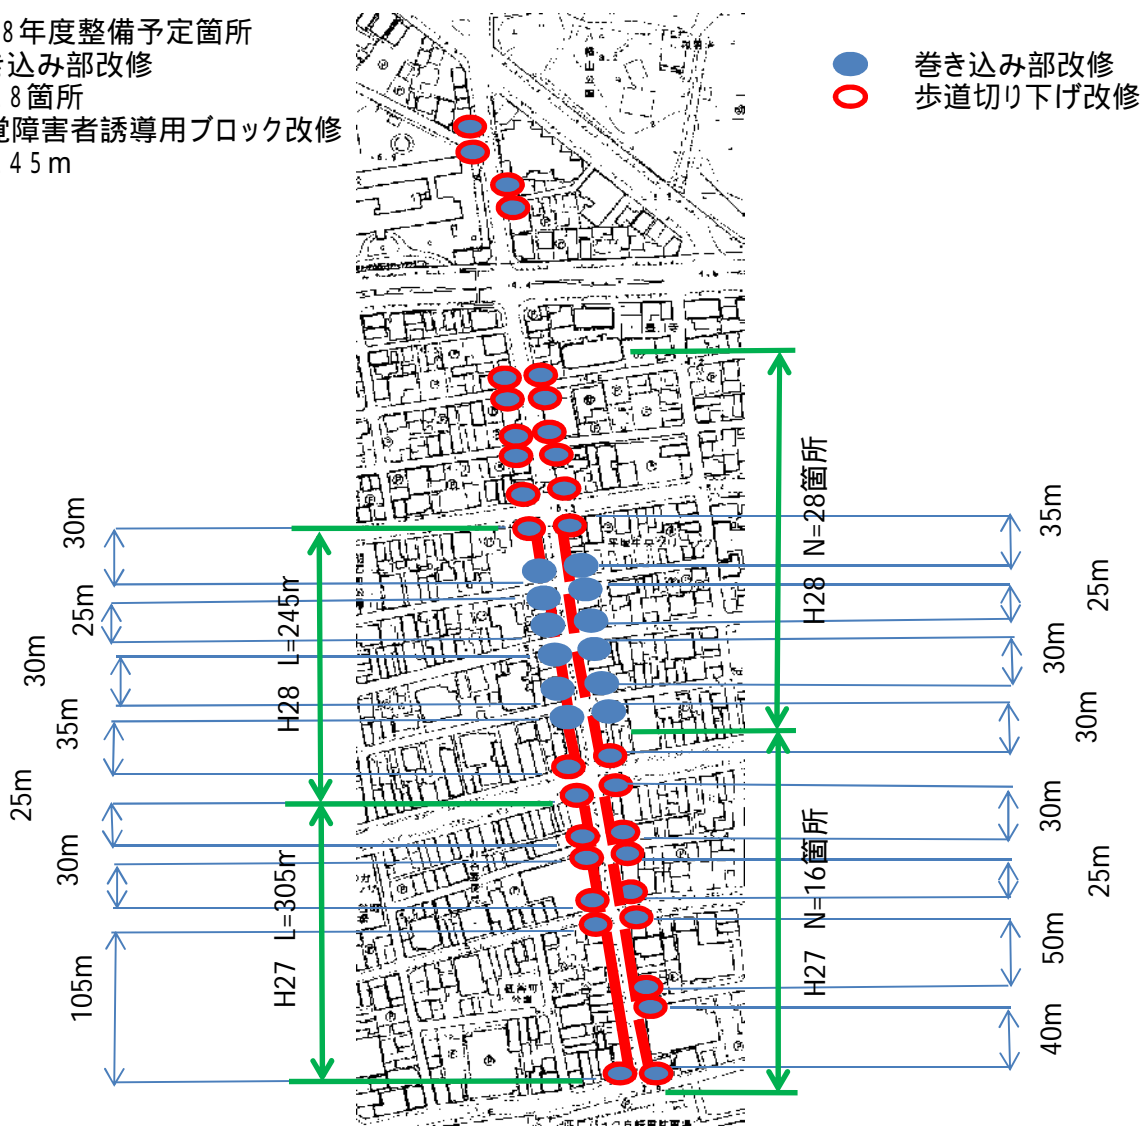


路線名	後谷八幡裏線(幹道28号)	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道舗装打ち換え(滑面平板、COとAs混在)	380m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

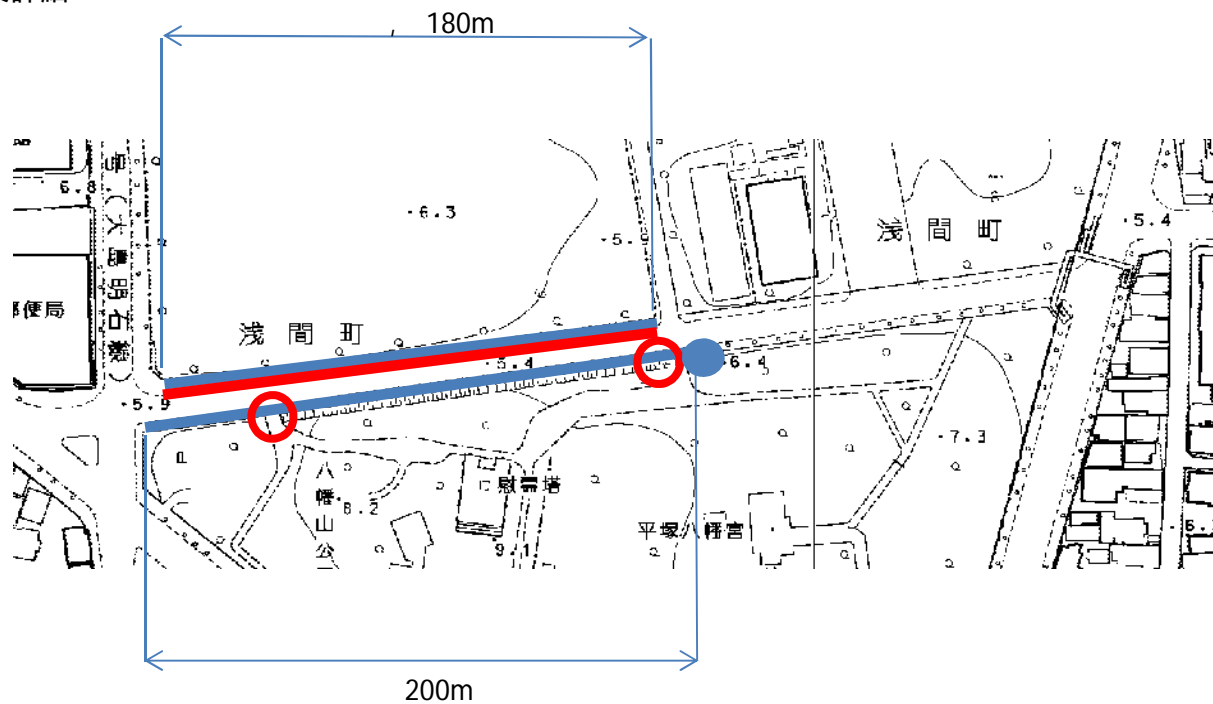

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修


平成28・29年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)  
 ... 1箇所  
 歩道切り下げ改修  
 ... 2箇所

路線名	平塚駅花水線（幹道35号）	事業者	平塚市					
事業区間	海岸南中線 ~ 南町通東浅間線	区間延長	195m					
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。							
事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】						
		実績						
		【短期】						
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	10箇所	26	27	28	29	30	31	32
			3					
		【短期】						
歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	26	27	28	29	30	31	32
		【短期】						
視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	26	27	28	29	30	31	32

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

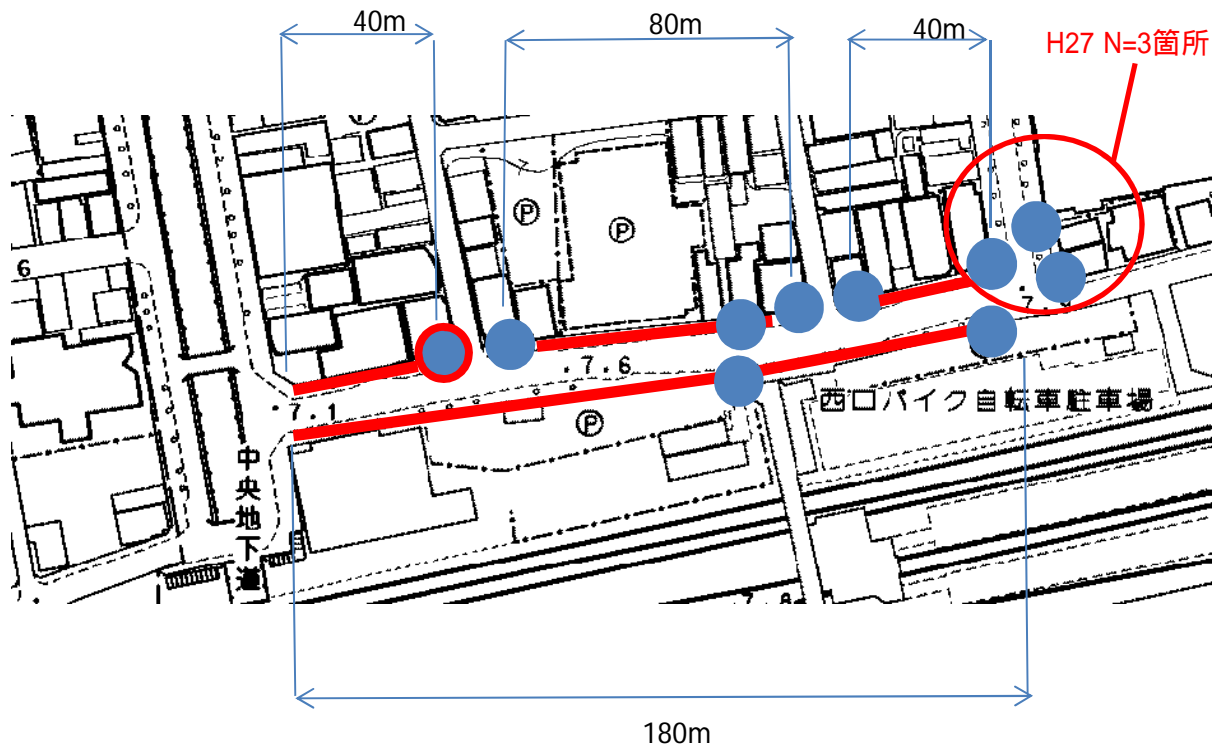

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

平成28年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
 …7箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 …340m

道路特定事業


路線名	八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅南口駅前広場 ~ 須賀打越羽衣町線	区間延長	191m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	12箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

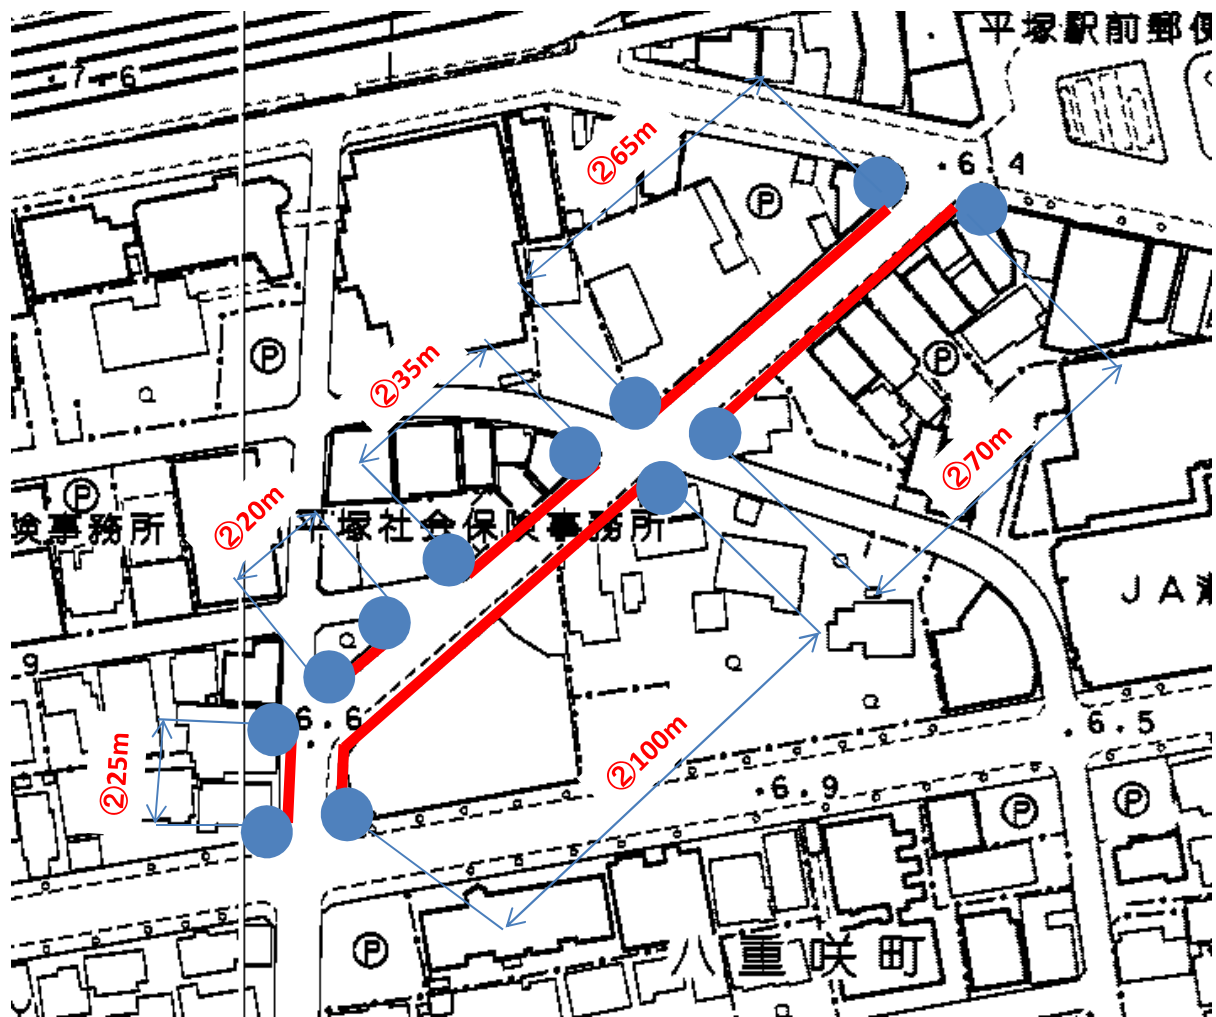

● 巻き込み部改修

平成28年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
 ……12箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 ……315m
