

平成30年度事業予定及び進捗状況

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況（10月1日時点）
				完了	事業中		
鉄道事業	①定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】		●	昇降設備（エレベーター・エスカレーター） 法令点検 12回（月1回）	※8月末現在 4月から8月（1回/月）を実施済
	②バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】		●	平塚駅サービス勉強会 12回	※8月末現在 月1回の勉強会を実施済
	③サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】		●	平塚駅社員資格受験	※8月末現在 サービス介助士2018年度新規取得者 5名
バス事業	①ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】		●	12両（累計77両）	5両導入済（計70両） ※1月2両、2月3両、3月2両 ※平成30年度、計12両導入予定
	②利用環境の向上	年1箇所	【長期】		●	実施に向けて検討中	実施に向けて検討中
	③④社員教育の実施	年1回以上	【継続】		●	1回	6回（月1回実施）
タクシー事業	①UDタクシーの導入	21台	【長期】		●	平塚市内事業者（8社：旭交通株・追分交通株・神奈中ハイヤー株・神田交通株・江南交通株・相模中央交通株・平塚交通株・富士見交通株、順不同） 8台（トヨタ） 江南交通株 1台（日産）	5台導入済 ※神奈中ハイヤー 1台（トヨタ） 神田交通 2台（トヨタ） 相模中央交通 1台（トヨタ）
	②情報の共有、各社の連携	随時	【継続】		●	12回	6/12回実施
	②乗務員教育の実施	年1回	【継続】		●	12回	6/12回実施

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	①交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】		●	・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討	・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	①歩道の段差改善	550m	【短期】	●			
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	①視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】	●			
6 駅前大通り線 (幹道31号)	①巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	4箇所	【長期】		●	4箇所(累計4箇所)	4箇所(累計4箇所) 施工中
	②側溝の床板化	10m	【中期】	●		H29完了	
	③視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】		●	10m(累計10m)	10m(累計10m) 10月上旬頃より工事着手予定
7 駅前通り線 (幹道47号)	①巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	15箇所	【長期】		●	—	—
	②側溝の床板化	165m	【長期】			—	—
8 南町通東浅間線(幹道34号)	①巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	44箇所	【短期】	●			
	②歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			—	—

8 南町通東浅間線（幹道34号）	②歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	5箇所	【長期】			—	—
	③視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】	●			
9 海岸南中線（幹道43号）	①巻き込み部改修（セフィドムつきでない）	2箇所	【中期】	●		H29完了	
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【中期】	●		H29完了	
	③歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【中期】	●		H29完了	
10 宝町通り線（幹道30号）	①巻き込み部改修（セフィドムつきでない）	29箇所	【短期】	●			
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】	●			
11 南町通り線（幹道32号）	①巻き込み部改修（セフィドムつきでない）	2箇所	【中期】	●		H29完了	
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【中期】	●		H29完了	
12 東海道本通り線（幹道29号）	①巻き込み部改修（セフィドムつきでない）	18箇所	【長期】		●	16箇所（累計18箇所）	16箇所（累計18箇所） 施工中
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	①巻き込み部改修（セフィドムつきでない）	1箇所	【短期】	●		H29完了	

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	②歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】	●		H29完了	
	③視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】	●			
	④歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			—	—
14 浅間町南原線（幹道20号）	①巻き込み部改修（セフィムつきでない）	10箇所	【長期】			—	—
15 浅間町3号線	②巻き込み部改修（セフィムつきでない）	2箇所	【長期】		●	2箇所（累計2箇所）	2箇所（累計2箇所） 施工中
	①歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			—	—
16 平塚駅花水線（幹道35号）	①巻き込み部改修（セフィムつきでない）	7箇所	【短期】	●		H29完了	
	②歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】	●		H29完了	
	③視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】	●		H29完了	
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	①巻き込み部改修（セフィムつきでない）	12箇所	【短期】	●		H29完了	
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】	●		H29完了	

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	①視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			—	125m (累計125m) 12月上旬頃より工事着手予定
19 三島神社後谷線 (幹道36号)	②視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】		●	305m (累計305m)	630m (累計630m) 12月上旬頃より工事着手予定
20 追分7号線	①巻き込み部改修 (セフィアムつきでない)	4箇所	【中期】		●	4箇所 (累計4箇所)	4箇所 (累計4箇所) 施工中
	②歩道切り下げ改修 (乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】			—	—
	③歩道舗装打ち換え (植樹柵隆起のため)	600m	【長期】			—	—

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚市総合公園	①総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【長期】		●	平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。	未舗装の舗装等改修を実施
	①出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【長期】		●	平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。	未舗装の舗装等改修を実施
	①園路の改善(勾配)	1箇所	【中期】	●			
	①トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】		●	屋外トイレ改修のための設計委託を実施する。	設計委託を実施し、関係課と協議・調整を実施
湘南海岸公園	①湘南海岸公園再整備	8,700m ²	【中期】		●	出入口の改善を行います。	車椅子の出入りを容易にするため、下半期に駐車場案内看板の移設を実施予定

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
交通安全特定事業	①交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】		●	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。	・重点整備地区内の付加装置付信号機29箇所(含む高齢者等感応付信号機)については全て点検済 ・横断歩道、標識等の補修については、随時上申中
	②違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】		●	2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	・6月を取締り強化期間として実施 ・2回目は10月にパトロール隊と合同で実施
	②交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】		●	・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。	・キャンペーンについては、各季の交通安全運動期間を中心に実施 ・交通マナー向上のため、交通安全教室、チリリンスクール、交通安全講和等を学校、企業等において随時開催 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中に交差点での交通監視活動、街角アドバイスを実施 ・自転車利用者に対する指導、取締りも継続的に実施 ・警察署ホームページ、FMナパサ等を活用した広報啓発活動を実施

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	①施設管理者との協議	年6回	【継続】		●	4回	1回 ※事業の進捗に応じて適宜実施予定
	②北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】		●	1回	0回 ※下半期に1回実施予定
	②北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】		●	1回	0回 ※下半期に1回実施予定
	③案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】		●	1回	1回
平塚駅駐輪場対周辺の	①自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】		●	—	—
	②自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】		●	7回	7回
	③放置自転車の撤去	通年	【継続】		●	通年で実施	通年で実施
安歩行者対策の	①自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】	●		—	—
	②生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】		●	—	—
(心の解、手助け)	①「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】		●	2回	2回 ※4月上旬の「発達障害啓発週間」にパネル展を、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」に啓発事業を実施 ※今後、12月の「障害者週間」期間中の障がい福祉事業所製品展示即売会等において啓発活動を展開予定
	②疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】		●	【提案】疑似・点字・誘導・手話体験の実施 100回	疑似・点字・誘導・手話体験の実施 45回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成30年度 事業予定	平成30年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー(理解、情報提供、手助け、利用)	①心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】		●	1回	0回 ※啓発用に11月～12月ごろ発行予定
	②生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】		●	各施設のバリアフリー情報の更新(適宜)	各施設のバリアフリー情報の更新(適宜)
	③バリアフリーマップの作成	一式	【中期】		●	バリアフリーマップの作成・印刷	バリアフリーマップの作成に向けて調整中
	④生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】		●	1回 平成30年5月開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 平成30年5月25日開催の商店会長会議において配布
	⑤活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】		●	1回 商店会長会議(5月頃開催予定)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。⇒【1回】	1回 商店会長会議(5月25日開催)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけました。⇒【1回】
	⑥ボランティア研修の実施	年3回	【継続】		●	3回	ボランティア研修の実施 0回 ※下半期で4回実施予定
公共サイン	①駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】		●	平塚駅から総合公園周辺に案内サインを1箇所、誘導サインを4箇所程度整備します。また、平成31年度以降に平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。	平塚駅から総合公園周辺に案内サイン2箇所、誘導サイン6箇所を整備予定です。また、平成31年度以降に平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。
	①駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】	●			


路線名	駅前大通り線（幹道31号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ～ 宮の前交差点	区間延長	405m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②側溝の床板化	10m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	10				
③視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足）	10m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

滑面タイルの歩道整備につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

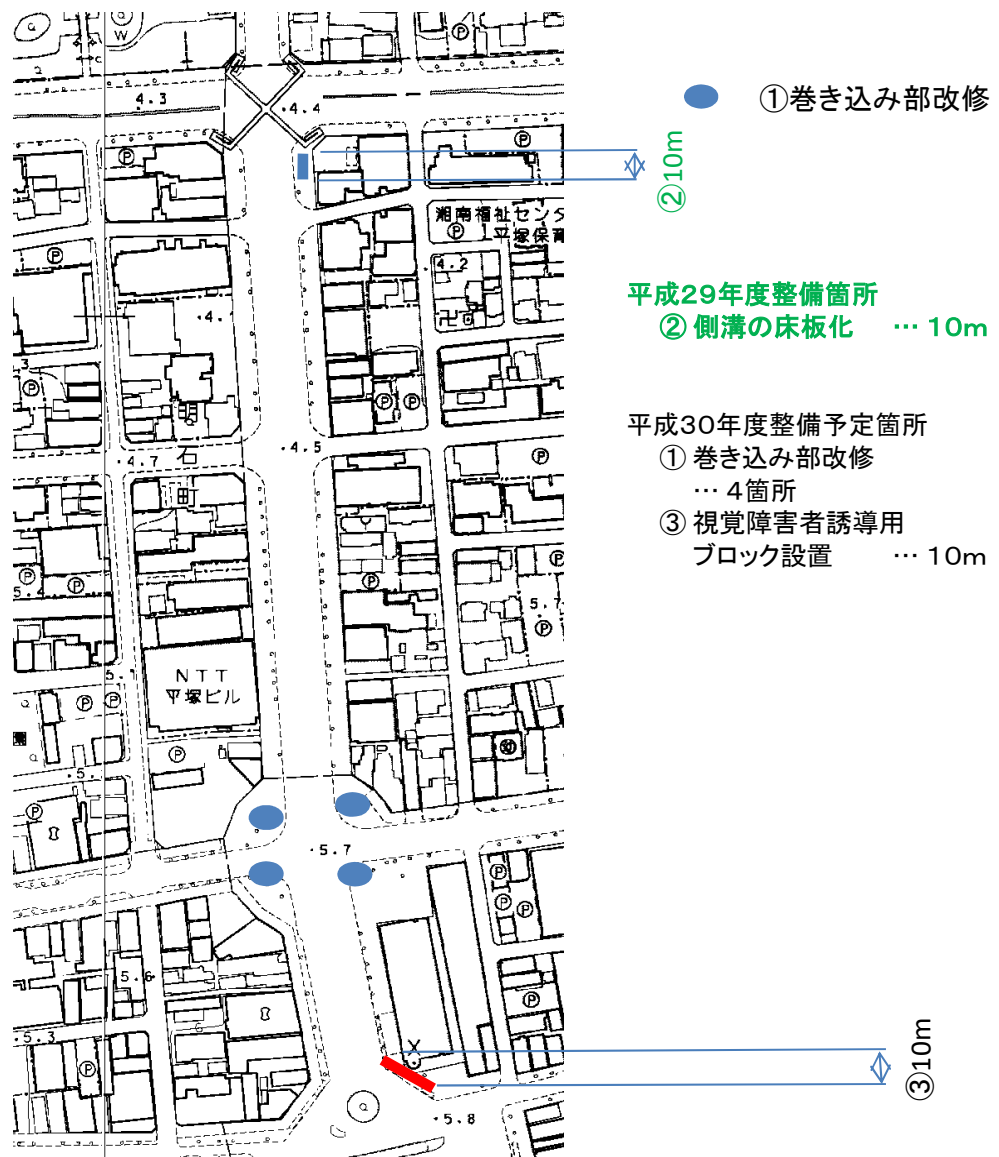

路線名	東海道本通り線（幹道29号）	事業者	平塚市
事業区間	MNプラザ ～ 市民センター	区間延長	680m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	18箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

滑面タイルの改修につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細



①H29 N=2箇所

平成29年度整備箇所

①巻き込み部改修 … 2箇所

● ①巻き込み部改修

平成30年度整備予定箇所

①巻き込み部改修 … 16箇所

路線名	浅間町3号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚警察署入口交差点 ～ 県合同庁舎前交差点	区間延長	445m
事業内容	①切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】						
		実績						
②巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	2箇所	【長期】						
		26	27	28	29	30	31	32
		-	-	-	-			
①横断歩道の歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】						
		26	27	28	29	30	31	32
		-	-	-	-			

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

①歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除

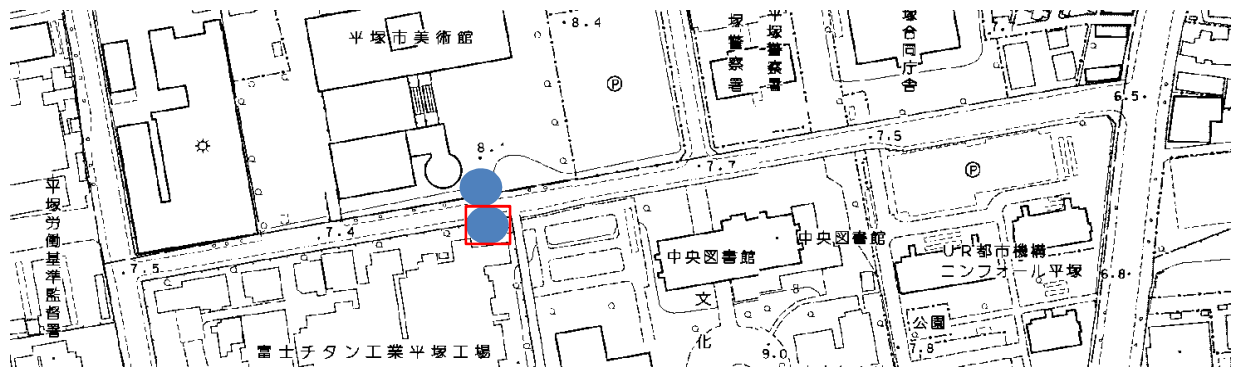

平成30年度整備予定箇所

② 巻き込み部改修 … 2箇所

● ②巻き込み部改修

□ ①横断歩道の歩道切り下げ改修

路線名	須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	事業者	平塚市
事業区間	モータースクール前交差点 ～ 久領堤交差点	区間延長	337m
事業内容	①視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	


事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

平成30年度整備予定箇所

- ① 視覚障害者誘導用ブロック設置
… 125m

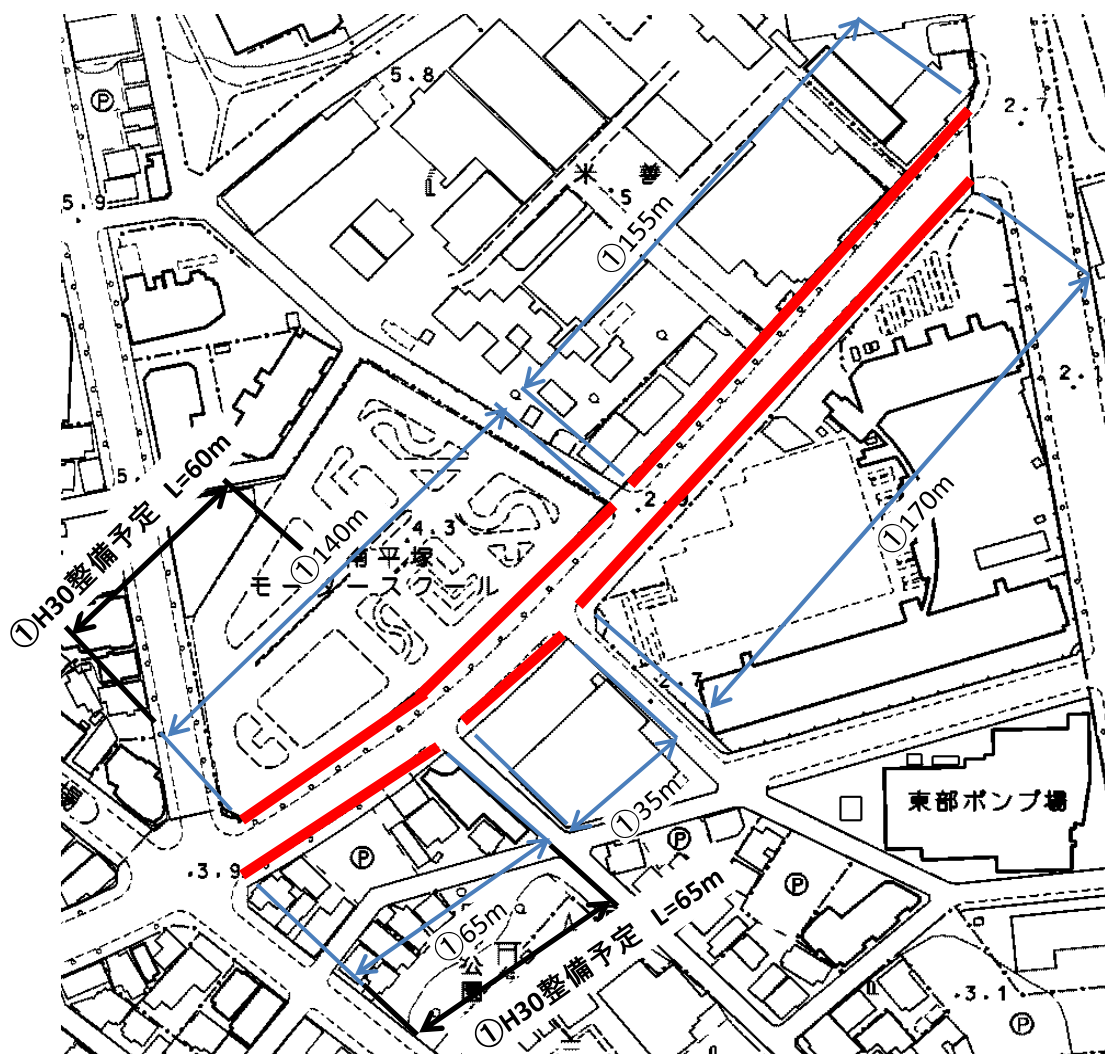

路線名	三島神社後谷線（幹道36号）	事業者	平塚市
事業区間	須馬踏切 ～ モータースクール前交差点	区間延長	433m
事業内容	①切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 ②視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。

事業詳細

平成30年度整備予定箇所
 ② 視覚障害者誘導用ブロック設置
 … 630m

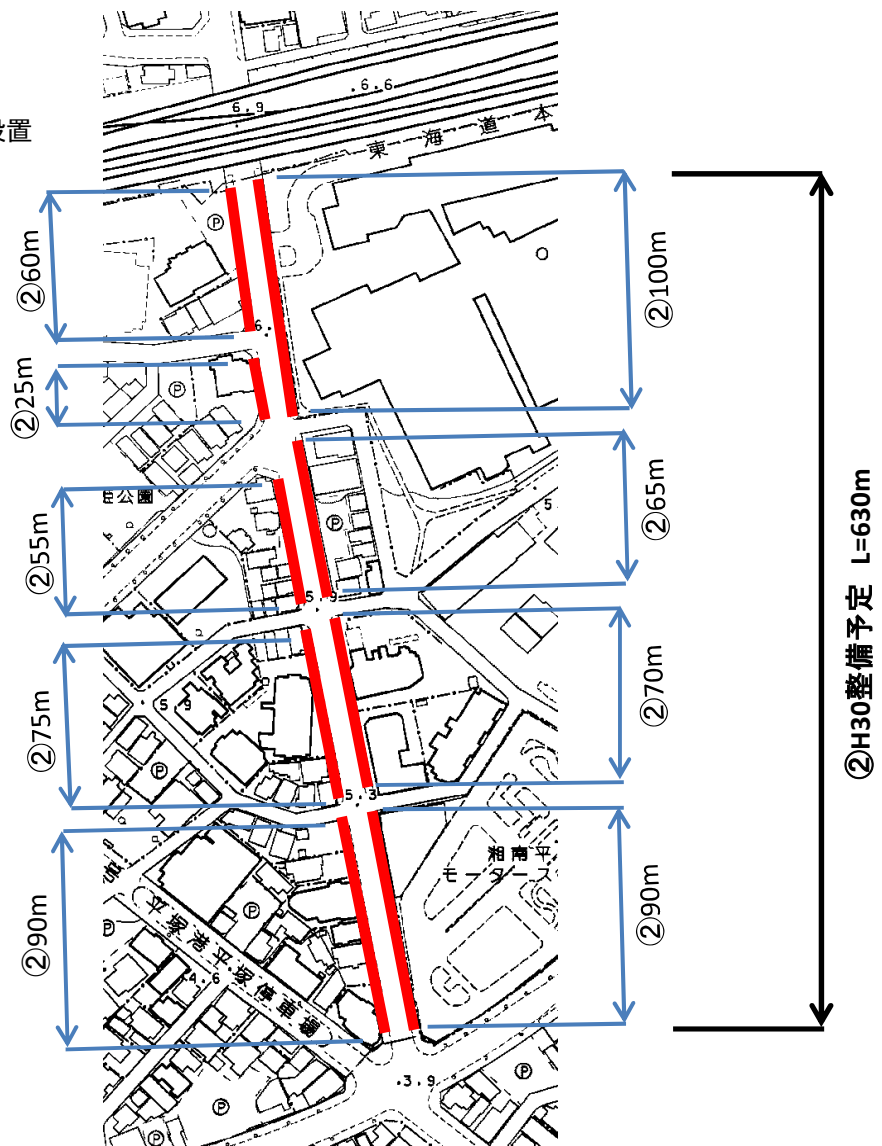

①歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除


路線名	追分7号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚ろう学校前交差点 ～ 大原交差点	区間延長	816m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーティングつきでない）	4箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超）	4箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
③歩道舗装打ち換え（植樹柵隆起のため）	600m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

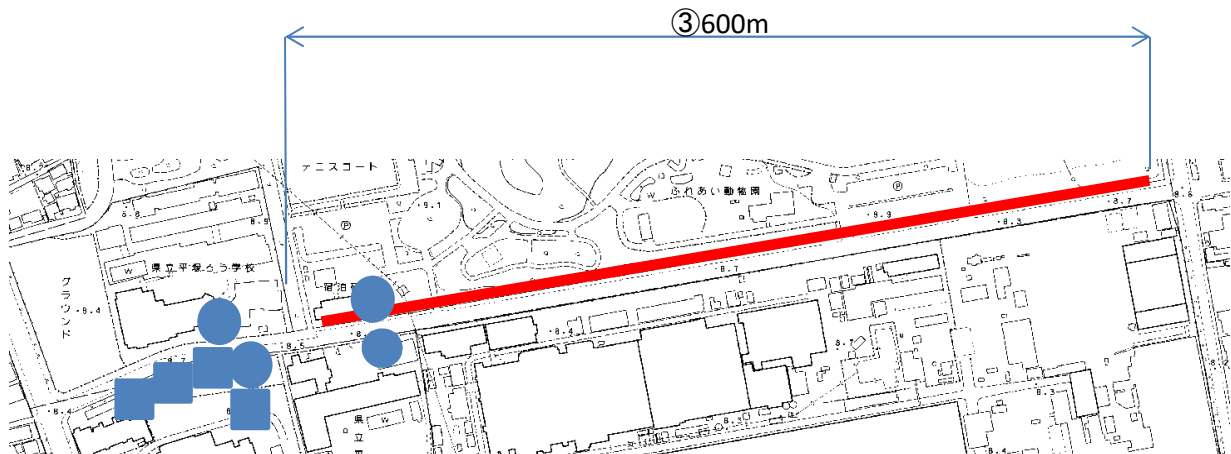

①巻き込み部改修



②歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超)

②歩道切り下げ改修(8%超)の箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除

平成30年度整備予定箇所

① 巻き込み部改修 … 4箇所
