

令和2年度事業予定及び進捗状況

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	9月末現在 4月から9月(1回/月)を実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回予定	9月末現在 月1回の勉強会を実施済
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅への転入者の資格取得	9月末現在 サービス介助士2020年度新規取得者 4名
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			4両(累計87両)(下期導入予定)	導入予定なし(累計83両) 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮して、下期4両導入予定から変更。
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上(月次教育で実施(座学)) また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。	6回(月1回実施) また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者(7社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中タクシー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・平塚交通(株)・富士見交通(株、順不同)7台(トヨタ)	10月1日現在のUDタクシー導入状況 R2.4~9は神奈中タクシー、日産セレナ1台(福祉車両)
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回	6/12回(一部書面協議による)
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回	6/12回

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】				
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】				
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	4箇所	【長期】				
	側溝の床板化	10m	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】				
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【長期】			R1完了	
	側溝の床板化	165m	【長期】			R1完了	
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道のみでの改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	

8 南町通東浅間線（幹道34号）	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	5箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道での改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】				
9 海岸南中線（幹道43号）	巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【中期】				
	歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【中期】				
10 宝町通り線（幹道30号）	巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】				
11 南町通り線（幹道32号）	巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【中期】				
12 東海道本通り線（幹道29号）	巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	18箇所	【長期】				
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	巻き込み部改修（セパイクムつきでない）	1箇所	【短期】				

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			72m（累計200m）	令和2年度中に完成予定
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【長期】			R1完了	
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【長期】				
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			R1完了	
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	7箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】				
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	12箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】				

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			440m (累計565m)	440m (累計565m) 施工中
19 三島神社後谷線 (幹道36号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】				
20 追分7号線	巻き込み部改修 (セフィロムつきでない)	4箇所	【中期】				
	歩道切り下げ改修 (乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】				
	歩道舗装打ち換え (植樹柵隆起のため)	600m	【長期】			R1完了	

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【長期】				
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【長期】				
	園路の改善(勾配)	1箇所	【中期】				
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			R1完了	
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700m ²	【中期】				

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			・交通安全施設(信号機、道路標識等)の点検を随時行い、緊急性、必要性の高い補修を行う。	・薄くなった道路標示のうち、スクールゾーン等の重要箇所における優先的な補修 ・必要性の低くなった大住中学校前交差点の信号機の廃止と隣接信号機の押ボタン式及び歩車分離式への改良(予定)
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			・駐車監視員活動ガイドラインを中心とした違法駐車取締り ・駐車監視員による違法駐車取締り ・歩道等における放置バイクの排除	今年度の駐車監視員活動ガイドライン対象路線の拡充(国道134号 唐ヶ原交差点～トラスコ湘南大橋、県道平塚停車場袖ヶ浜線 代官町交番前交差点～平塚駅南口入口交差点) 10月22～31日までの違法駐車追放強化期間における違法駐車取締りと違法駐車追放の広報啓発活動の強化(予定)
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・各季の運動中におけるキャンペーンによる広報啓発活動 ・交通安全の日、各季の運動における交差点での交通監視やパトカーによる交通安全広報 ・小学校等における交通安全教室・講話	・4月6～15日 春の全国交通安全運動、5月 自転車マナーアップ強化月間、6月 二輪車交通事故防止強化月間及び暴走族追放強化月間、7月11～20日 夏の交通事故防止運動、8月3～12日 交通死亡事故抑制対策、9月21～30日 秋の全国交通安全運動における広報、啓発活動の実施 ・湘南平塚サイクルポリスによる自転車等に対する広報、啓発活動の実施

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回	4回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
平塚駅駐輪場対周策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修を実施予定	八重咲町公園第1駐輪場改修工事を開始(10/1~3/31)年度末に完了予定
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	2回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	通年で実施
安全行者の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			R1完了	
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			- 生活関連経路以外の路線で実施	- 生活関連経路以外の路線で実施
心の解、バリアフリー(理)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			3回 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」、12月上旬の「障害者週間」に実施したパネル展において啓発活動を行う予定	2回 4月上旬「発達障害啓発週間」と7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」に実施したパネル展において啓発活動を行った。今後、12月の「障害者週間」期間中に同様の啓発活動を実施予定。
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			【提案】疑似・点字・誘導・手話体験の実施100回	3回 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言下、その後、夏季までは予定していた福祉学習体験のキャンセルが続いた。秋以降は、問い合わせも増えつつあり、11月からの各種福祉学習の依頼は増えている。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定	令和2年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー (理解、手助け、 利用を妨げない、 情報提供)	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回 チラシを作成するとともに、市内各公共施設へ配架し、各種イベント等で配布予定	1回 ともに生きるかながわ推進週間に実施したパネル展や身体障害者手帳交付説明会、新採用職員研修会において配布した。 今年度においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、各種イベント等が中止になり配布の機会が減少している。 今後、バリアフリーハンドブック、クリアファイル等を作成し、引き続き配布する予定。
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			各施設のバリアフリー情報の更新(適宜)	事業進捗状況に応じて、「ひらつかわくわくマップ」を適宜更新
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			共生社会ホストタウン事業と連携したバリアフリーマップの作成・印刷(下半期) 10月開催予定の協議会にて原案を確認予定	業務委託を発注し、作成中。 11月末に作成予定。
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 令和2年5月開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 令和2年5月開催の商店会長会議が新型コロナウイルス感染症の影響で中止になったため、10月に商業観光課経由で郵送予定
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。	商店会長宛てに資料を郵送し、各個店や商店街での取組みを働きかける予定。(商店会長会議は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました)
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	0回(年度内に3回予定)
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			駅北口周辺への公共施設等案内サインの設置は令和元年度整備済みであり、目標は達成したと考えている。今後は、平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画している公共サインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ、引き続き検討します。	
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】				


路線名	後谷八幡裏線(幹道28号)	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	1				完了
歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				完了
視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		180							完了
歩道舗装打ち換え(滑面平板)	200m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	-	-	128	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

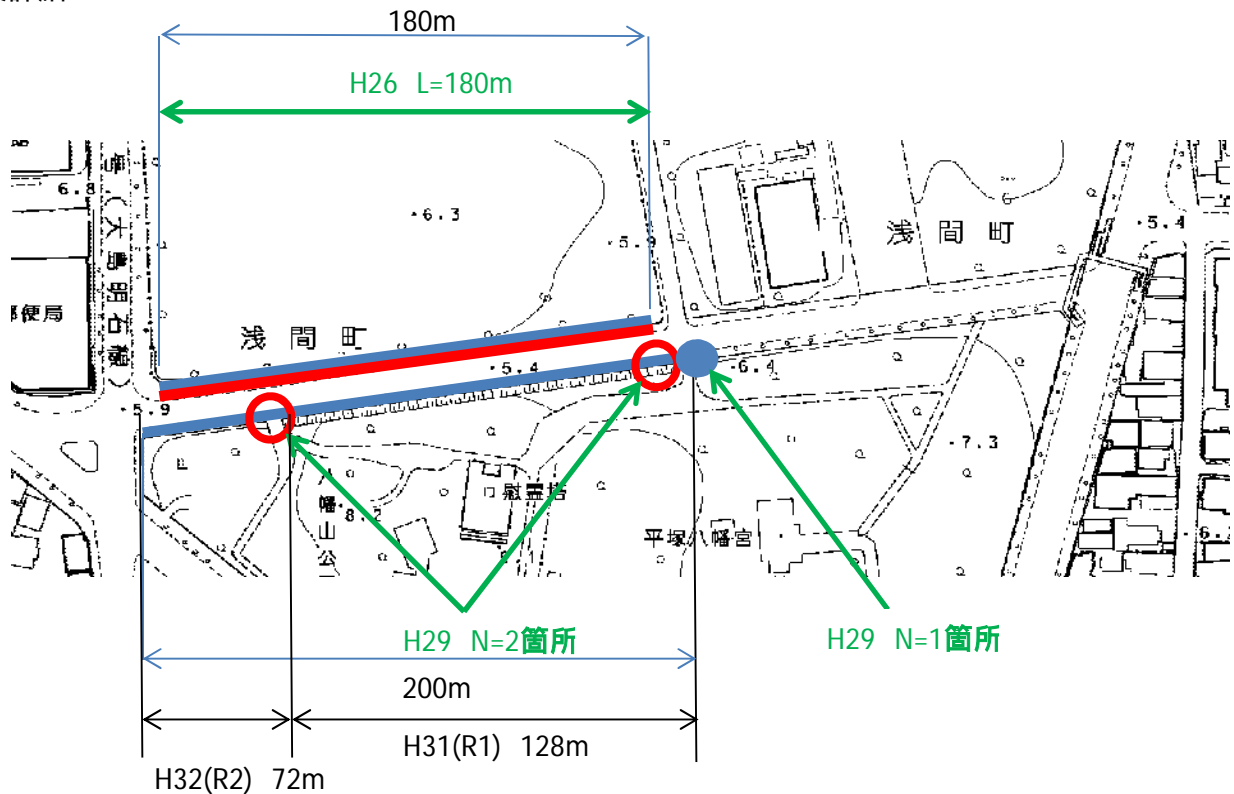

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修
- 令和元年度整備箇所
歩道舗装打ち換え(滑面平板) ... 128m
- 令和2年度整備箇所(予定)
歩道舗装打ち換え(滑面平板) ... 72m

路線名	須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	事業者	平塚市
事業区間	モータースクール前交差点 ~ 久領堤交差点	区間延長	337m
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	125	-		
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

平成30年度整備箇所
視覚障害者誘導用ブロック設置 ... 125m

令和2年度整備予定箇所
視覚障害者誘導用ブロック設置 ... 440m

